Nom	Date de début	Date de fin
Agrafage châssis	01/06/16	01/06/16
Soudage châssis	02/06/16	02/06/16
couche defond châssis	03/06/16	03/06/16
montage train des essieux	06/06/16	06/06/16
montage train des essieux da...	07/06/16	07/06/16
agrafage de la caisse	01/06/16	01/06/16
soudage " inter" caisse	02/06/16	02/06/16
soudage "ext " caisse	03/06/16	03/06/16
nettoyage caisse	06/06/16	06/06/16
couche de fond caisse	07/06/16	07/06/16
poser la caisse sur châssis	08/06/16	08/06/16
l'instalation hydrolique	09/06/16	09/06/16
monter porte arriére	10/06/16	10/06/16
compléter le véhicule	13/06/16	13/06/16
préparer à la peinture	14/06/16	14/06/16
mise en peinture	15/06/16	15/06/16
retouches	16/06/16	16/06/16
l'installation électrique	17/06/16	17/06/16

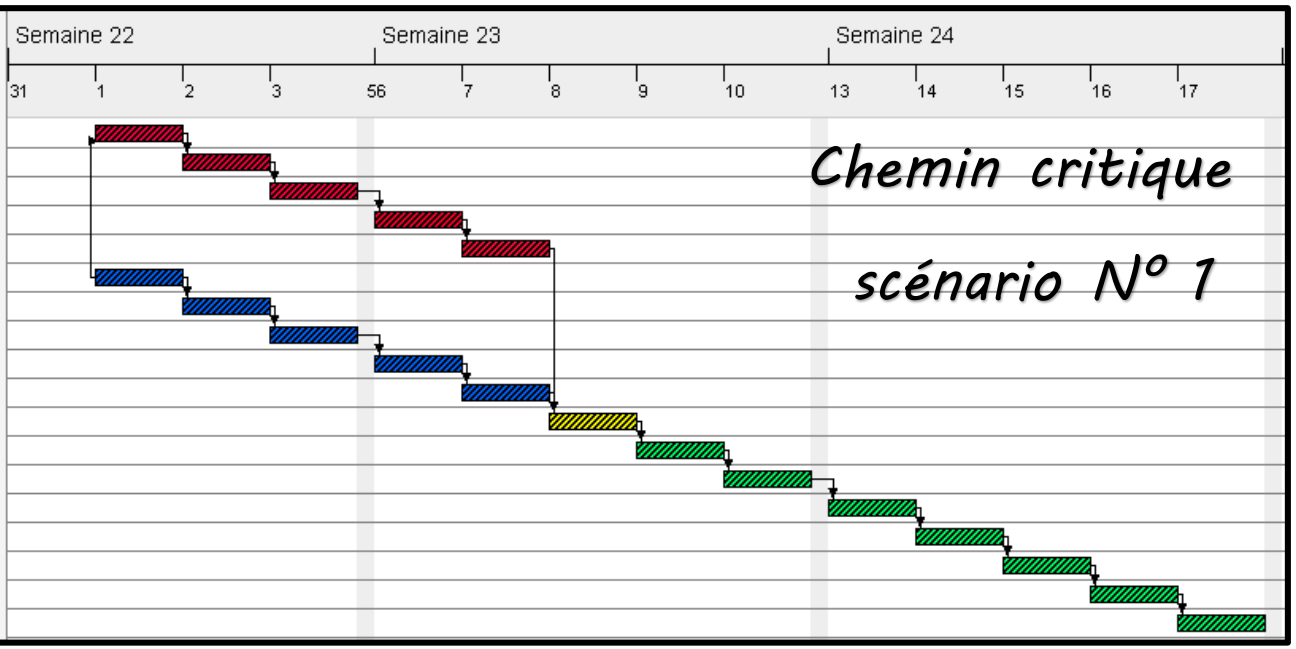
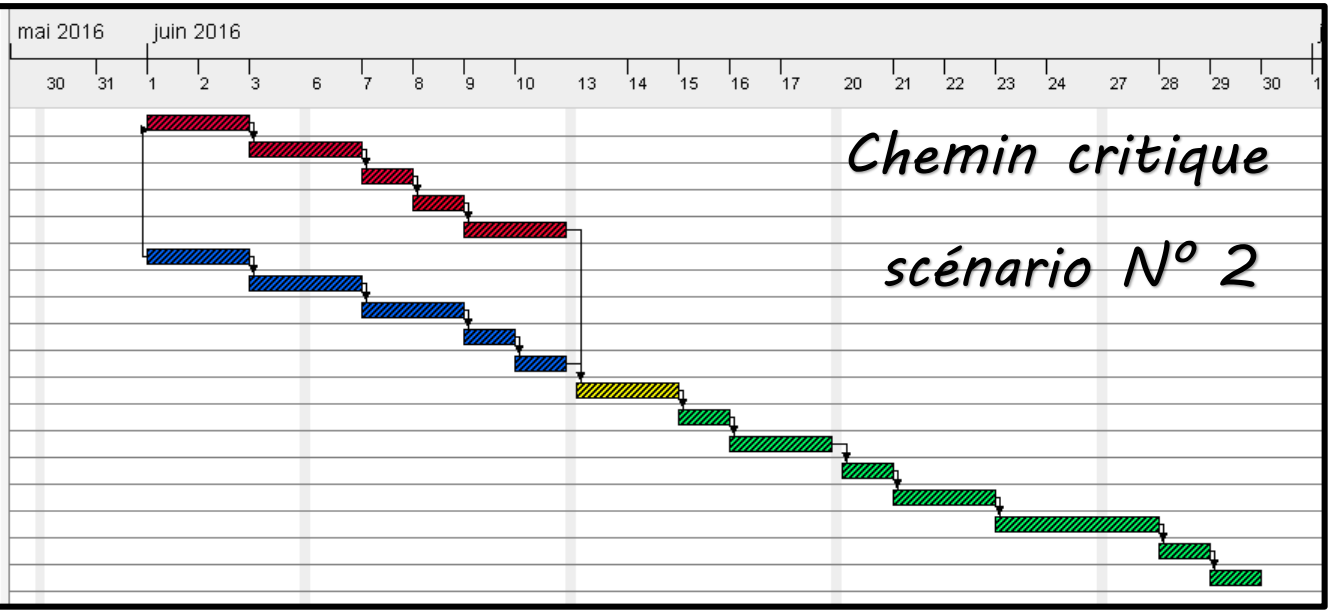
Nom	Date de début	Date de fin
Agrafage châssis	01/06/16	02/06/16
Soudage châssis	03/06/16	06/06/16
couche defond châssis	07/06/16	07/06/16
montage train des essieux	08/06/16	08/06/16
montage train des essieux da...	09/06/16	10/06/16
agrafage de la caisse	01/06/16	02/06/16
soudage " inter" caisse	03/06/16	06/06/16
soudage "ext " caisse	07/06/16	08/06/16
nettoyage caisse	09/06/16	09/06/16
couche de fond caisse	10/06/16	10/06/16
poser la caisse sur châssis	13/06/16	14/06/16
l'instalation hydrolique	15/06/16	15/06/16
monter porte arriére	16/06/16	17/06/16
compléter le véhicule	20/06/16	20/06/16
préparer à la peinture	21/06/16	22/06/16
mise en peinture	23/06/16	27/06/16
retouches	28/06/16	28/06/16
l'installation électrique	29/06/16	29/06/16
